



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNDIA		Nº OPERAÇÃO 1078503-60	Nº SICONV 916444	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		MUNICÍPIO / UF FLORÂNDIA-RN		REPASSE 287.306,00	CONTRAPARTIDA 694,00	INVESTIMENTO 288.000,00	Nº RRE 2

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: jan-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 27.585,46	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	---	------------------------	----------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	Licitado / Em Execução	5066,27	m²	0	2	260.414,54	133.305,33	127.109,21	260.414,54	100,00%	
							(%)	(100,00%)	(51,19%)	(48,81%)	(100,00%)	100,00%
							Repasse	259.720,54	132.950,07	126.770,47	259.720,54	
							Contrapartida	694,00	355,26	338,74	694,00	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	260.414,54	133.305,33	127.109,21	260.414,54	

Acumulado Anterior: 51,19%

Observações:

FLORÂNDIA-RN

Local

Saint Clay Alcântara S. de Medeiros

Representante Tomador

Nome: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

segunda-feira, 22 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 2115647947

ART/RRT: RN20220483124

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078503-60	Nº SICONV 916444	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA	Apelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	Nome da Empresa EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Nº CTEF 0
---------------------------	---------------------	--	--	---	--------------

Medição: **2** Período: **28/10/2023 a 16/01/2024** % Realizado Período.: **48,81%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2	2	2	2																						
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	2	2																						
4	PAVIMENTAÇÃO	1	1	2	2																						
5	CALÇADA e MURO DE ARRIMO	1	1	2	2																						
6	PINTURA	1	1	2	2																						
7	SINALIZAÇÃO	2	2	2	2																						

Medições	Data das Medições											
	27/10/2023	16/01/2024										
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	51,19%	48,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	133.305,33	127.109,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	51,19%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	133.305,33	260.414,54	260.414,54	260.414,54	260.414,54	260.414,54	260.414,54	260.414,54	260.414,54	260.414,54	260.414,54	260.414,54

FLORÂNIA-RN
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR
Data: 26/01/2024 09:23:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 2115647947
ART/RRT: RN20220483124



Ofício nº: 01/2024-AT

FLORÂNIA-RN, 22 de janeiro de 2024

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1078503-60 - SICONV nº 916444

Objeto: Pavimentação de ruas no município de Florânia-RN.
Proponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 259.720,54	R\$ 126.770,47	R\$ 259.720,54
Contrapartida Financeira:	R\$ 694,00	R\$ 338,74	R\$ 694,00
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 260.414,54	R\$ 127.109,21	R\$ 260.414,54
Execução Física:	-	48,81%	100,00%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORÂNIA

Ofício nº 004 /2024-AT

Florânia/RN, 14 de Março de 2024.

À Caixa Econômica Federal
Ilmo. Senhor.

André Ricardo Mendes Vieira

GIGOV/NA – Gerência Executiva e Negocial de Governo Natal/RN

Assunto: Encaminhamento de Justificativa

Contrato de Repasse nº **1078503-60/2021** – **Operação 916444/2021**

Programa: Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária –M. Cidades

Objeto: **Pavimentação de ruas no município de Florânia-RN.**

Senhor Gerente,

Ao cumprimenta-lo vimos pelo presente, encaminhar em anexo a Justificativa Técnica para finalização de serviços executados pela Empresa, a qual submetemos a essa GIGOV, relativa ao contrato acima citado.

Aguardando o deferimento do pleito, subscrevemo-nos atenciosamente.

Assinado de forma digital por
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA
DE MEDEIROS:05034321483
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.001.20604

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS

Prefeito Municipal


JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - 916444

A CEF


CR 1078.503-60/2021 – Pavimentação de ruas

Trata-se de Justificativa Técnica para finalização de serviços executados pela Empresa **EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 29.288.569/0001-86**, justificando que Devido a necessidade de execução de serviços complementares não existente em planilha orçamentária licitada, faz-se necessário a solicitação de atendimento a execução formulada em glosa, , constante no projeto inicial, já executada, restando apenas estes acréscimos que necessitam serem concluídos, não calculados na planilha original da CR nº 916444.

O que temos na memória de cálculo, Rua Francisco Guedes de Azevedo = $118,20 + 60,85 = 179,05 \times 1,10 = 196,96$) + R. Francisco Frágoso $43,30 \times 1,10 = 47,63$), a prefeitura providenciará o aditivo para executar o complemento do passeio da Rua Francisco Frágoso na Rua Francisco Guedes não há necessidade de construção de passeio dos dois lados da Rua.

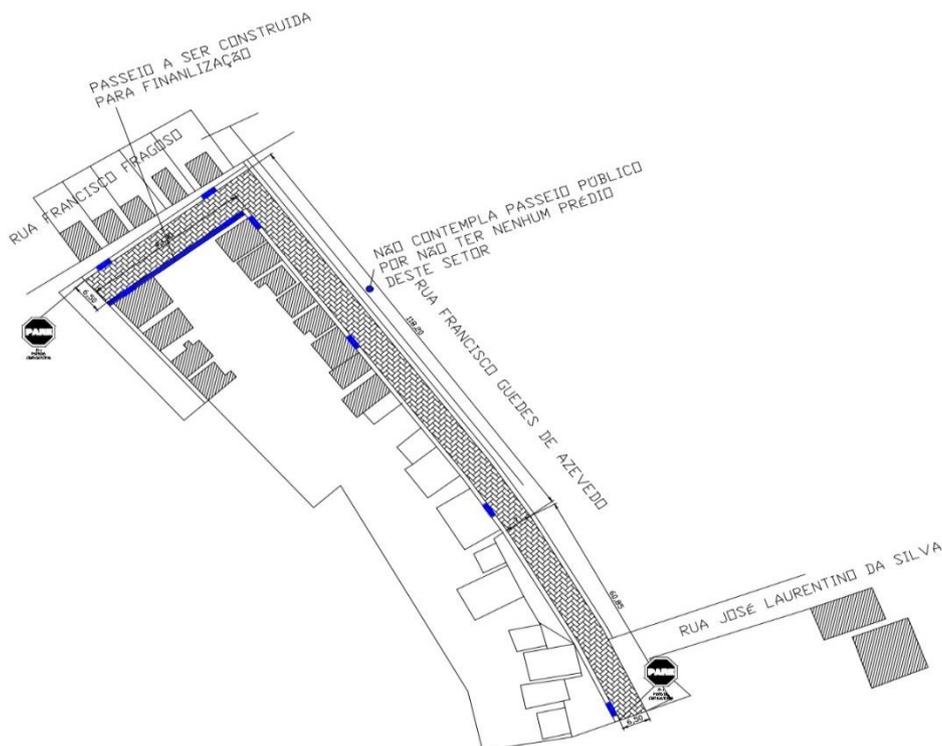

Nas Rua Tomaz Barbosa Vasconcelos temos na memória de calculo - 01 = $(42,40 + 16,00 + 78,65) 137,05 \times 1,10 = 150,76 +$ (Etapa 2 = $30,50 + 8,40 + 62,00 = 100,90 \times 1,10 = 110,99$) + $(66,72 \times 1,10 = 73,39)$, que foi executado toda a extensão continua da rua, ficando a executar por conta da Empresa o trecho que fica de um dos lado da projeção da Praça apresentado em detalhe abaixo.

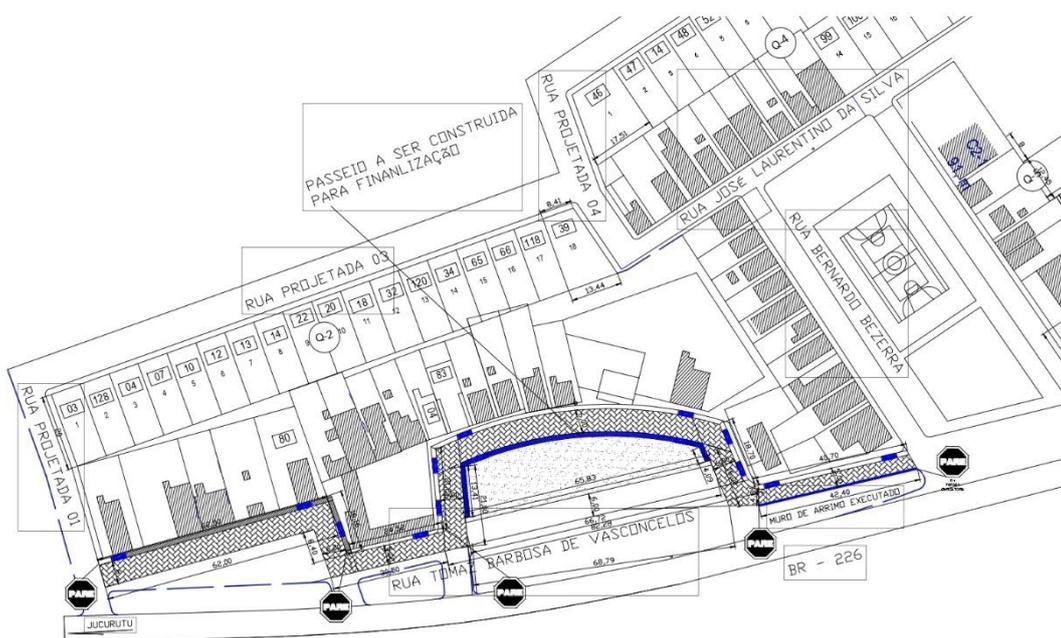

No aguardo da análise e aceitação por parte do setor competente da CEF a nossa proposta, reiteramos votos de estima e consideração

Florânia/RN, 14 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR
Data: 14/03/2024 18:00:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 2115647947



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
Rua Teonia Amaral, 290 – CENTRO - FLORANIA – RN - 59335-000
CNPJ - [08.181.562/0001-90](https://cnpj.gov.br/08.181.562/0001-90)

TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

O Município de Florânia/RN, inscrito no CNPJ sob o nº **08.181.562/0001-90**, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. **EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR/Engenheiro Civil – Nº 2115647947/CREA**, atesta que a obra de **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**, Convênio nº **916444**, Situada na Zona Urbana do Município de Florânia/RN, licitação nº 002/2022, Contrato/RN nº 016/2023-PMF, executada pela **Empresa Extrema Construções e Empreendimentos**, localizada no Município de Florânia/RN – CEP 59335-000, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e está de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas, incluindo Pavimentações em Paralelepípedo e Passeios Públicos.

Conforme quantitativos abaixo:

1.		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
1.1.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	QUANT.
1.1.1.	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	1,00
1.2.		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1.	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	m ²	2.925,60
1.2.2.	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	6,00
1.3.		PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1.	101169	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m ²	2.925,60
1.3.2.	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.053,04
1.4.		CALÇADA e MURO DE ARRIMO		
1.4.1.	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	138,10
1.4.2.	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m ³	94,86
1.4.3.	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	m ²	579,73
1.4.4.	00038135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	m ²	21,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
Rua Teonia Amaral, 290 – CENTRO - FLORANIA – RN - 59335-000
CNPJ - [08.181.562/0001-90](https://cnpj.gov.br/08.181.562/0001-90)

1.4.5.	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m3	8,48
1.4.6.	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m3	16,96
1.5.		PINTURA		
1.5.1.	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.053,04
1.6.		SINALIZAÇÃO		
1.6.1.	00034723 - insumo	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m2	0,64
1.6.2.	00013521 - insumo	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Unidade	5,00

Florânia/RN, 16 de janeiro de 2024.


EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA 2115647947


SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

OBRA: Pavimentação de ruas no município de Florânia-RN.

CONVÊNIO: 916444

LOCAL: BAIRRO PASSAGEM DAS FLORES - FLORÂNIA / RN

RELATÓRIO FOTOGRAFICO – FINAL DE OBRA




Vista Rua Francisco Fragoso



Vista Rua Francisco Fragoso



Vista Rua Francisco Fragoso e Rua Francisco Guedes de Azevedo (Passeio Público)

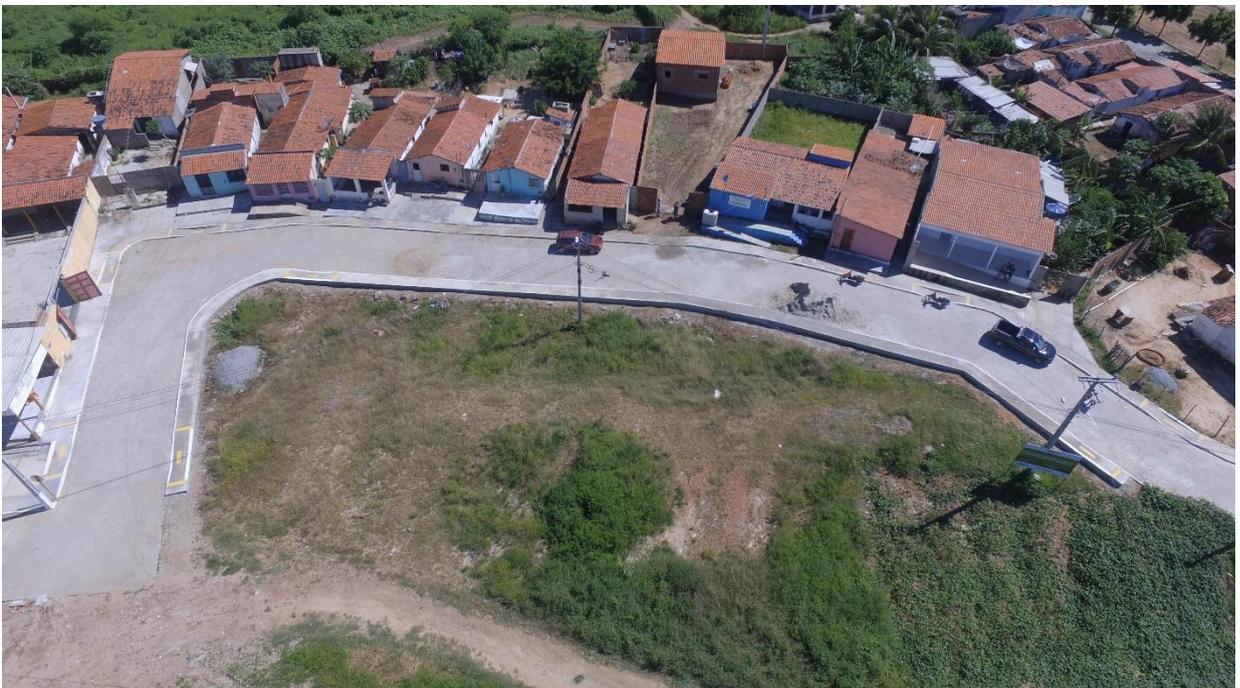

Rua Tomaz Barbosa de Vasconcelos (Passeio Público)



Rua Tomaz Barbosa de Vasconcelos (Passeio Público)



Rua Tomaz Barbosa de Vasconcelos (Passeio Público)

Documento assinado digitalmente
gov.br EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR
Data: 30/04/2024 08:29:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Expedito Araújo de Lima Júnior
Engenheiro Civil
CREA 2115647947
